

Poročilo o pregledu stanovanj za montažo plinskih peči

Lokacija pregleda: Trdinova 5b
Izvajalec pregleda: Dimnikar Deteljica
Namen pregleda: Pregled stanovanj in dimniških tuljav pred načrtovano montažo plinskih peči.

1. Ugotovitve pregleda

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je sredinska dimniška tuljava prosta. Kljub temu je treba pred začetkom del izvesti dodatno preveritev, da se potrdi pravilnost tuljave za posamezno nadstropje oziroma stanovanje.
Pred začetkom montažnih del mora na dan montaže na lokacijo ponovno priti dimnikar. V 2. nadstropju je treba sneti koleno in s krtačo preveriti, ali je uporabljena tuljava pravilna. Dodatno je treba preveriti sredinsko tuljavo tako, da se preveri potek tuljave s krtačo in potrdi, ali krtača pride po pravi tuljavi.


2. Razpored tuljav po nadstropjih

Oznaka tuljave	Nadstropje	Opomba
1. tuljava	1. nadstropje	Predvidena tuljava za 1. nadstropje.
2. tuljava	3. nadstropje	Potrebna dodatna preveritev, ali gre za pravilno tuljavo.
3. tuljava	2. nadstropje	Potrebna preveritev v 2. nadstropju s snetjem kolena in krtačo.

Po običajnem pravilu bi morale biti tuljave razporejene zaporedno po nadstropjih: 1. nadstropje, 2. nadstropje in 3. nadstropje. Ker trenutni razpored ni popolnoma skladen s tem zaporedjem, je pred montažo potrebna dodatna potrditev.

Na podlagi pregleda je bilo ugotovljeno, da je sredinska tuljava prosta, vendar je zaradi nejasnosti pri zaporedju tuljav po nadstropjih pred montažo plinskih peči obvezna dodatna preveritev.

SREDINSKA TULJAVA JE PROSTA:

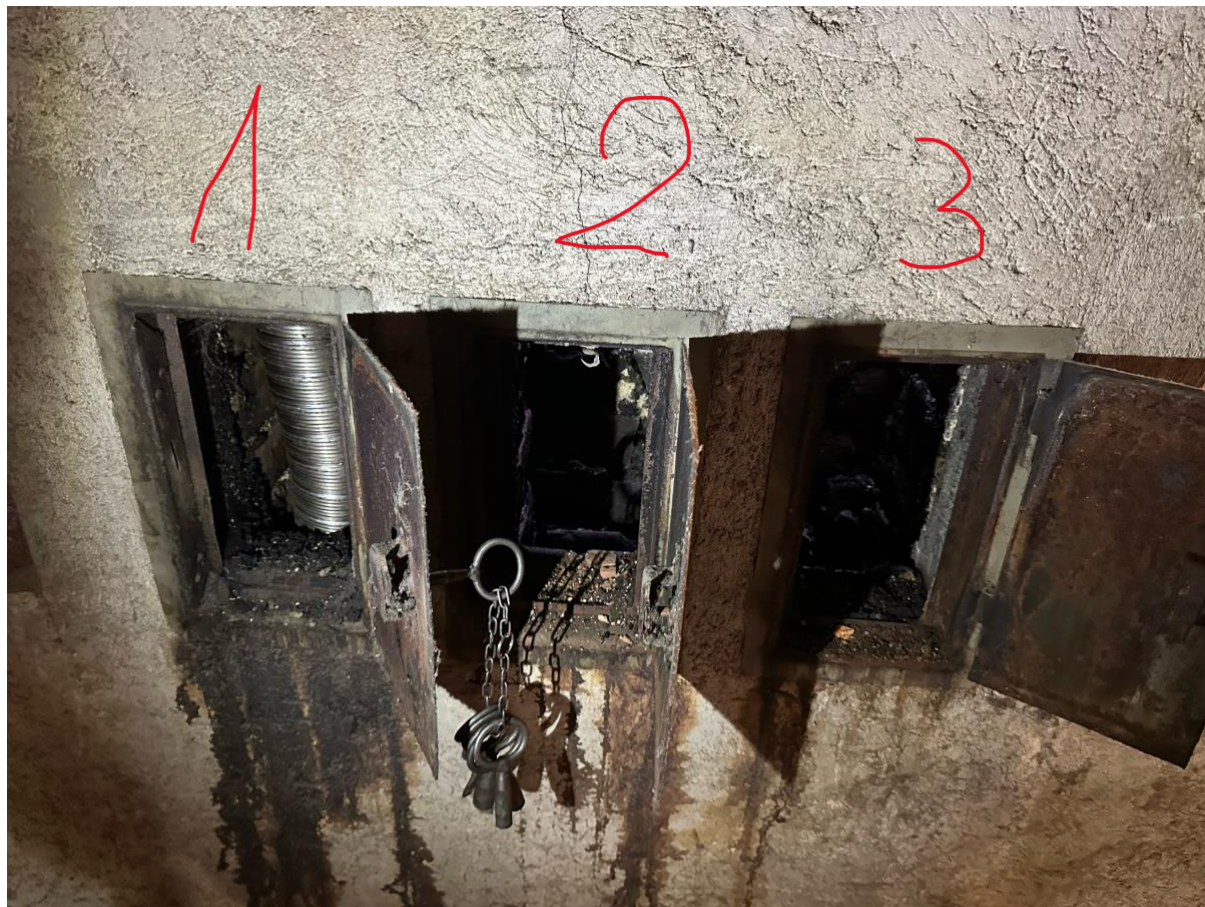

PLINSKA PEČ V STANOVANJU POD GOSPO REBA (2. NADSTROPJE), PRI NJEJ BI BILO POTREBNO SNETI KOLENO IZ STENE IN ŠE ENKRAT PREVERITI Z DIMNIKARJEM ALI JE 3. TULJAVA PRAVILNA. DIMIKAR SAM NI ŽELEL SNEMATI KOLENA, KER ZA TO NI POOBLAŠČEN IN RAJE VIDI, DA TU SPROTI NAREDIJO IZVAJALCI, KI BODO PRAVILNO NAMESTILI KOLENO NAZAJ V STENO.

